Project-Plan-v1.0

SERVEASE

Editor FIANNEIOY MEATOMENH, Contributor FEPMANOS Δ HMHTPIOS, Peer Reviewers FPHMANHS Δ AMIANOS, NTOYAAI ASKEPI


Σύνθεση Ομάδας:

- 1. Γερμανός Δημήτριος Αριθμός Μητρώου: 1084594 Έτος Σπουδών: 4ο
- 2. Γιαννείου Μελπομένη Αριθμός Μητρώου: 1084649 Έτος Σπουδών: 4ο
- 3. Γρημάνης Δαμιανός Αριθμός Μητρώου: 1084571 Έτος Σπουδών: 4ο
- 4. Ντουλάι Ασκέρι Αριθμός Μητρώου: 1070902 Έτος Σπουδών: 7ο

Project Plan

Μετά την ανάλυση των απαιτήσεων του έργου και την εκτίμηση του φόρτου εργασίας για κάθε υποέργο, καταλήξαμε στον ακόλουθο χρονοπρογραμματισμό.

A) GANTT CHART

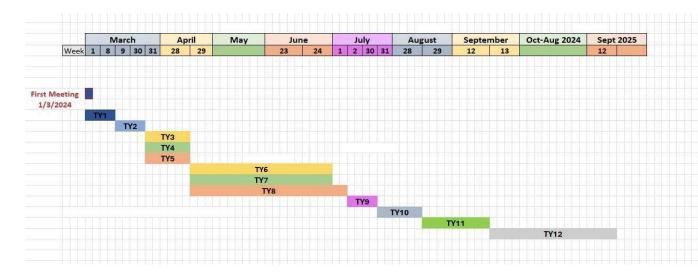


Τυπικά Υποέργα	Starting Date	End Date	
TY1	1/3/2024	8/3/2024	
TY2	9/3/2024	30/3/2024	
TY3	31/3/2024	28/4/2024	
TY4	31/3/2024	28/4/2024	
TY5	31/3/2024	28/4/2024	
TY6	29/4/2024	24/6/2024	
TY7	29/4/2024	24/6/2024	
TY8	29/4/2024	1/7/2024	

TY9	2/7/2024	30/7/2024
TY10	31/7/2024	28/8/2024
TY11	29/8/2024	12/9/2024
TY12	13/9/2024	12/9/2025

ΤΥ1 : Επικοινωνία με Πελάτη
ΤΥ2 : Ανάλυση Αναγκών
ΤΥ3 : Σχεδιασμός UI
ΤΥ4 : Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
ΤΥ5 : Σχεδιασμός Κλάσεων
ΤΥ6 : Ανάπτυξη UI
ΤΥ7 : Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων
ΤΥ8 : Ανάπτυξη Κλάσεων
ΤΥ9 : Διασύνδεση Και Ολοκλήρωση Έργου
TY10 : Testing
TY11 : Παρουσίαση-Release
ΤΥ12 : Συντήρηση

B) PERT CHART



Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Για την υλοποίηση του έργου μας θα δουλέψουν σύνολο 4 άτομα. Καθένας από εμάς θα αναλάβει να βγάλει εις πέρας ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αναλυτικότερα, η ανάθεση του έργου σε ανθρώπινο δυναμικό συνεπάγεται ότι η ομάδα μας περιέχεται από έναν προσωπικό επικεφαλής του έργου ο οποίος αναλαμβάνει και την δοκιμή του έργου, ένα designer ο οποίος θα επιμεληθεί τον σχεδιασμό, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της διεπαφής –χρήστη, τον σχεδιαστή της Βάσης Δεδομένων μας καθώς και τον προγραμματιστή μας ο οποίος θα υλοποιήσει το λογισμικό σε JAVA.

Δ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τυπικά Υπόεργα	Ανθρωποημέρε
	ς
TY1	7
TY2	21
TY3	28
TY4	28
TY5	28
TY6	25
TY7	25
TY8	63
TY9	28
TY10	28
TY11	14

1 1 1 1	14			
Τυπικά	Υπεύθυνος	UI Designer	Database	Java Developer
Υπόεργα	Έργου		Engineer	
TY1	7	-	-	-
TY2	5	5	5	5
TY3	8	20	-	-
TY4	8	-	20	-
TY5	8	-	-	20
TY6	5	20	-	-
TY7	5	-	20	-
TY8	12	-	-	51
TY9	7	7	7	7
TY10	28	-	-	-
TY11	14	-	-	-
Σύνολο	107	52	52	83
Ανθρωποημερ				
ών				

Η συντήρηση του έργου έχει ετήσια κοστολόγηση και δεν υπολογίζεται από τις ανθρωποημέρες.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία εξάγεται ως εξής:

 Μία (1) ώρα εργασίας του υπεύθυνου έργου κοστίζει 20 ευρώ ενώ για τους υπόλοιπους 15 ευρώ. Έτσι, έχουμε:

Υπεύθυνος Έργου: 107 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 20 ευρώ/ώρα = 17.120 ευρώ.

Designer: 52 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 6.240 ευρώ. Σχεδιαστής Βάσης Δεδομένων: 52 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 6.240 ευρώ.

JAVA Developer: 83 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 9.960 ευρώ.

- Κόστος Υποστήριξης και Συντήρησης: Απαιτούμενη ενημέρωση και διαχείριση του λογισμικού για να διατηρηθεί συμβατό με νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Μία αρκετά καλή συνδρομή ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης κοστίζει γύρω στα 5.000 ευρώ.
- Έξοδα Εργασίας(εξοπλισμός, μεταφορά, χώρος εργασίας, φαγητό, καφές-νερό) και Επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα κειμένου κλπ): 4 * 2.500 ευρώ = 10.000 ευρώ.
- Κάθε ημέρα είναι εργάσιμη και το κάθε άτομο δουλεύει 8 ώρες.

Σύνολο: 54.560 ευρώ.

Τελική προσφορά έργου 67.654 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ(24%).

To Project-Plan-v1.0 είναι ίδιο με το Project-Plan-v0.1.
