Project-Plan-v0.1

SERVEASE


Σύνθεση Ομάδας:

- 1. Γερμανός Δημήτριος Αριθμός Μητρώου: 1084594 Έτος Σπουδών: 4ο
- 2. Γιαννείου Μελπομένη Αριθμός Μητρώου: 1084649 Έτος Σπουδών: 4ο
- 3. Γρημάνης Δαμιανός Αριθμός Μητρώου: 1084571 Έτος Σπουδών: 4ο
- 4. Ντουλάι Ασκέρι Αριθμός Μητρώου: 1070902 Έτος Σπουδών: 7ο

Project Plan

Μετά την ανάλυση των απαιτήσεων του έργου και την εκτίμηση του φόρτου εργασίας για κάθε υποέργο, καταλήξαμε στον ακόλουθο χρονοπρογραμματισμό.

A) GANTT CHART

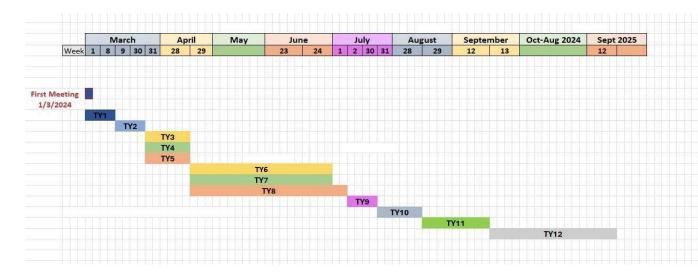


| Τυπικά Υποέργα | Starting Date | End Date | |
|----------------|---------------|-----------|--|
| TY1 | 1/3/2024 | 8/3/2024 | |
| TY2 | 9/3/2024 | 30/3/2024 | |
| TY3 | 31/3/2024 | 28/4/2024 | |
| TY4 | 31/3/2024 | 28/4/2024 | |
| TY5 | 31/3/2024 | 28/4/2024 | |
| TY6 | 29/4/2024 | 24/6/2024 | |
| TY7 | 29/4/2024 | 24/6/2024 | |
| TY8 | 29/4/2024 | 1/7/2024 | |

| TY9 | 2/7/2024 | 30/7/2024 |
|------|-----------|-----------|
| TY10 | 31/7/2024 | 28/8/2024 |
| TY11 | 29/8/2024 | 12/9/2024 |
| TY12 | 13/9/2024 | 12/9/2025 |

| ΤΥ1 : Επικοινωνία με Πελάτη |
|---------------------------------------|
| ΤΥ2 : Ανάλυση Αναγκών |
| ΤΥ3 : Σχεδιασμός UI |
| ΤΥ4 : Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων |
| ΤΥ5 : Σχεδιασμός Κλάσεων |
| ΤΥ6 : Ανάπτυξη UI |
| ΤΥ7 : Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων |
| ΤΥ8 : Ανάπτυξη Κλάσεων |
| ΤΥ9 : Διασύνδεση Και Ολοκλήρωση Έργου |
| TY10 : Testing |
| TY11 : Παρουσίαση-Release |
| ΤΥ12 : Συντήρηση |

B) PERT CHART



Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Για την υλοποίηση του έργου μας θα δουλέψουν σύνολο 4 άτομα. Καθένας από εμάς θα αναλάβει να βγάλει εις πέρας ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αναλυτικότερα, η ανάθεση του έργου σε ανθρώπινο δυναμικό συνεπάγεται ότι η ομάδα μας περιέχεται από έναν προσωπικό επικεφαλής του έργου ο οποίος αναλαμβάνει και την δοκιμή του έργου, ένα designer ο οποίος θα επιμεληθεί τον σχεδιασμό, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της διεπαφής –χρήστη, τον σχεδιαστή της Βάσης Δεδομένων μας καθώς και τον προγραμματιστή μας ο οποίος θα υλοποιήσει το λογισμικό σε JAVA.

Δ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

| Τυπικά Υπόεργα | Ανθρωποημέρε |
|----------------|--------------|
| | ς |
| TY1 | 7 |
| TY2 | 21 |
| TY3 | 28 |
| TY4 | 28 |
| TY5 | 28 |
| TY6 | 25 |
| TY7 | 25 |
| TY8 | 63 |
| TY9 | 28 |
| TY10 | 28 |
| TY11 | 14 |

| 1 1 1 1 | 14 | | | |
|-------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| Τυπικά | Υπεύθυνος | UI Designer | Database | Java Developer |
| Υπόεργα | Έργου | | Engineer | |
| TY1 | 7 | - | - | - |
| TY2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TY3 | 8 | 20 | - | - |
| TY4 | 8 | - | 20 | - |
| TY5 | 8 | - | - | 20 |
| TY6 | 5 | 20 | - | - |
| TY7 | 5 | - | 20 | - |
| TY8 | 12 | - | - | 51 |
| TY9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TY10 | 28 | - | - | - |
| TY11 | 14 | - | - | - |
| Σύνολο | 107 | 52 | 52 | 83 |
| Ανθρωποημερ | | | | |
| ών | | | | |

Η συντήρηση του έργου έχει ετήσια κοστολόγηση και δεν υπολογίζεται από τις ανθρωποημέρες.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία εξάγεται ως εξής:

 Μία (1) ώρα εργασίας του υπεύθυνου έργου κοστίζει 20 ευρώ ενώ για τους υπόλοιπους 15 ευρώ. Έτσι, έχουμε:

Υπεύθυνος Έργου: 107 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 20 ευρώ/ώρα = 17.120 ευρώ.

Designer: 52 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 6.240 ευρώ. Σχεδιαστής Βάσης Δεδομένων: 52 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 6.240 ευρώ.

JAVA Developer: 83 ανθρωποημέρες * 8 ώρες * 15 ευρώ/ώρα = 9.960 ευρώ.

- Κόστος Υποστήριξης και Συντήρησης: Απαιτούμενη ενημέρωση και διαχείριση του λογισμικού για να διατηρηθεί συμβατό με νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Μία αρκετά καλή συνδρομή ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης κοστίζει γύρω στα 5.000 ευρώ.
- Έξοδα Εργασίας(εξοπλισμός, μεταφορά, χώρος εργασίας, φαγητό, καφές-νερό) και Επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα κειμένου κλπ): 4 * 2.500 ευρώ = 10.000 ευρώ.
- Κάθε ημέρα είναι εργάσιμη και το κάθε άτομο δουλεύει 8 ώρες.

Σύνολο: 54.560 ευρώ.

Τελική προσφορά έργου 67.654 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ(24%).
